Sprint Planning · E3 Equivalencias USAL

Oct 14, 2026 · @Juan Martín

Resumen

E3 llega a producción en **4 hitos y 8 sprints de 2 semanas** (19 de octubre de 2026 al 12 de febrero de 2027), y cada hito cierra con un tramo del trámite que funciona de punta a punta.

- **Punto de partida:** el backend es un esqueleto vacío (solo `.gitkeep`), el frontend tiene la base técnica (tokens, cliente HTTP, router, layout público) y el contrato de la API está propuesto en `Docs/API.md` pero no acordado.
- **Criterio de avance:** el trámite se construye siguiendo la máquina de estados de RF-ESTADO-001. Cada hito suma un bloque de transiciones (1–5, 6–15, 16–26) y las pantallas que las disparan.
- **Desarrollo correlativo:** en cada sprint el backend implementa los endpoints y el frontend construye las pantallas que los consumen. Para no esperar al backend, el frontend trabaja contra mocks del contrato y los cambia por la API real antes de cerrar el sprint.

Supuestos y forma de trabajo


Tema	Supuesto
Duración del sprint	2 semanas, de lunes a viernes. Pausa de fiestas del 24 de diciembre al 3 de enero
Equipo	Al menos una persona en backend y una en frontend. Si el equipo es más chico, cada sprint se estira
Ceremonias	Planning al inicio, daily breve, review con demo y retro al cierre de cada sprint
Ramas	Gitflow del README: `feature/*` → `develop` → `main`. Un commit toca solo `backend/` o solo `frontend/`
Release	Al cierre de cada hito se mergea `develop` a `main` con un tag (`v0.1`, `v0.2`, `v0.3`, `v1.0`)

Tema	Supuesto
Entorno	Java corre siempre dentro de Docker (no hay JDK ni Maven en la máquina de desarrollo)

Definition of Done de cada historia

- [ ] Endpoint implementado según `Docs/API.md`, con test de servicio (JUnit 5 + Mockito) y test de integración de la transición.
- [ ] Pantalla conectada a la API real, con estados de carga, vacío, error y éxito (§0.5 de `frontend-interfaces.md`).
- [ ] Acciones críticas con doble confirmación (RF-AUTH-006).
- [ ] Cambio de estado registrado en `estados_solicitud` y en auditoría.
- [ ] Documentación actualizada en el mismo PR si cambió el contrato, con su entrada en `GESTION_CAMBIOS.md`.

Vista general

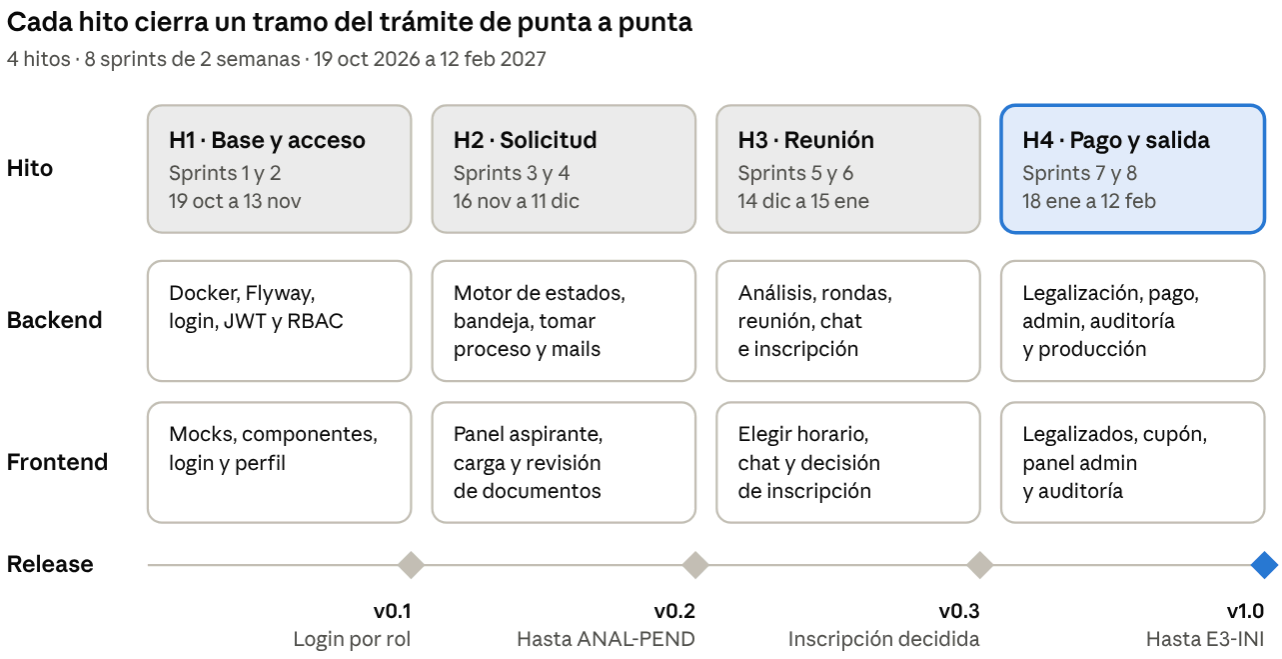

hoja de ruta · 4 hitos, backend y frontend en paralelo

Backend y frontend avanzan en paralelo sobre el mismo bloque de transiciones; cada hito termina con un release que lleva el trámite un tramo más lejos.

Hito 1 · Base técnica y acceso (sprints 1–2)

Al cierre del hito, cada rol puede ingresar al sistema y ver su panel vacío, sobre un backend que corre en Docker con la base de datos migrada.

Sprint	Backend	Frontend
S1 · 19 oct – 30 oct	`pom.xml`, Dockerfile y Docker Compose (backend, PostgreSQL, pgAdmin). Migraciones Flyway de `usuarios`, `roles`, `aspirantes`, `carreras`, `estados` (20) y `auditoria_sistema`. Formato de error común y Swagger UI	Cerrar los puntos abiertos del contrato (§10.3 de `API.md`). Capa de mocks del contrato. Componentes base (inputs, modal de doble confirmación, tabla, badge de estado). Actualizar `frontend-interfaces.md` a los 20 estados de la v12
S2 · 2 nov – 13 nov	RF-AUTH-001 a 005: registro de aspirante con código por mail, login con bloqueo por intentos, OAuth Google @usal.edu.ar, login de Admin, JWT y RBAC con `revoked_at`. RF-AUTH-007: perfil	Pantallas de registro, verificación de código, login de aspirante, login institucional y perfil. `AuthContext`, rutas protegidas por rol y layout privado con menú por rol

Criterios de cierre del Hito 1

- [ ] Un solo comando del Makefile levanta backend, base y pgAdmin desde cero.
- [ ] El contrato de la API queda acordado y versionado en `API.md`.
- [ ] Los seis roles entran y ven su panel; un usuario revocado no accede.
- [ ] Seed demo con un usuario por rol y las carreras de prueba.

Hito 2 · Solicitud y revisión documental (sprints 3–4)

Al cierre del hito, un aspirante crea su solicitud y carga documentos, y un Académico la toma, la revisa documento por documento y la acepta o la devuelve (transiciones 1 a 5).

Sprint	Backend	Frontend
S3 · 16 nov – 27 nov	Motor de transiciones: valida rol, permiso de participante y `estadoEsperado`, registra en `estados_solicitud` y auditoría. Tablas `solicitudes` y `documentos_solicitud`. RF-ASP-001 y 002: crear solicitud y subir documentos. Catálogos de carreras y estados	Panel del aspirante. Formulario de nueva solicitud. Carga de documentos con validación de tipo y tamaño. Vista de estado y responsables (RF-ASP-003) con historial del proceso
S4 · 30 nov – 11 dic	Permisos por carrera (`user_career_permissions`). RF-PROC-001 a 004: bandeja ordenada, detalle, tomar proceso y darse de baja. RF-ACAD-001 y 009: marcas tilde/cruz, aceptar o rechazar. RF-ASP-004: recarga selectiva. Servicio de notificaciones por mail en cada cambio de estado (RF-ESTADO-002)	Bandeja del Académico y de Secretaría. Detalle de solicitud. Botón Tomar proceso con manejo de `PROCESO_YA_TOMADO`. Revisión por documento con tilde/cruz. Recarga de documentos marcados del lado del aspirante

Criterios de cierre del Hito 2

- [ ] Una solicitud recorre `SOL-INI` → `DOC-REV` → `DOC-RECH` → `DOC-REV` → `ANAL-PEND` en la demo.
- [ ] Una transición inválida responde 409 `TRANSICION_INVALIDA` y la pantalla lo muestra.
- [ ] Cada cambio de estado deja una fila de auditoría y envía su mail.
- [ ] Dos académicos que toman el mismo proceso a la vez: solo uno queda asignado.

Hito 3 · Análisis, reunión e inscripción (sprints 5–6)

Al cierre del hito, el Académico propone el análisis preliminar, aspirante y Académico acuerdan la reunión (con rondas de fechas o por chat) y el Académico acepta o rechaza la inscripción (transiciones 6 a 15).

Sprint	Backend	Frontend
S5 · 14 dic – 23 dic	`analisis_academico`, `rondas_reunion`, `horarios_propuestos` y `reuniones`. RF-ACAD-002: matriz, horario de cursada y fechas (multipart). RF-ASP-005: elegir horario o pedir otras fechas. RF-ACAD-003: segunda ronda, rechazo de ronda y fijar fecha, con enlace de Meet	Formulario de análisis preliminar con carga de archivos y fechas. Pantalla del aspirante para elegir horario, pedir otras fechas o rechazar la 2.ª ronda. Vista de reunión pendiente con el enlace de Meet
S6 · 4 ene – 15 ene	RF-MSG-001 a 004: chat grupal por solicitud con historial. RF-ACAD-004: reunión realizada o no asistió, y actualización del análisis en `ANAL-POST`. RF-ACAD-006: aceptar o rechazar inscripción	Chat embebido en el detalle de la solicitud, abierto por defecto en `REU-CHAT`. Modal de Fijar fecha. Acciones de reunión finalizada y no asistió. Decisión de inscripción con doble confirmación. Informe de materias del aspirante (RF-ASP-006)

S5 es más corto por las fiestas: si no alcanza, la segunda ronda y Fijar fecha pasan a S6.

Criterios de cierre del Hito 3

- [ ] La demo recorre los tres caminos de la reunión: fecha en 1.ª ronda, fecha en 2.ª ronda y fecha por chat.
- [ ] No existe forma de llegar a una 3.ª ronda de fechas.
- [ ] Una no asistencia vuelve la solicitud a `REU-FEC-ACAD` y se reprograma.
- [ ] Una inscripción rechazada termina en `INSC-RECH` y no admite más acciones.

Hito 4 · Legalización, pago, administración y salida (sprints 7–8)

Al cierre del hito, el trámite completo llega a `E3-INI`, el Admin gestiona usuarios, carreras y permisos, el Revisor audita, y el sistema queda listo para producción (`v1.0`, transiciones 16 a 26).

Sprint	Backend	Frontend
S7 · 18 ene – 29 ene	RF-ASP-009 y RF-ACAD-005: indicar legalidad, aviso de legalizados y su revisión. RF-SEC-001 y 002: cupón en PDF con monto, comprobante y verificación del pago. `cupones_pago` y `comprobantes_pago`	Pregunta de legalidad y recarga de legalizados. Revisión de legalizados (reutiliza tilde/cruz del Hito 2). Panel de Secretaría: enviar cupón y controlar el pago. Carga y reenvío de comprobante del aspirante
S8 · 1 feb – 12 feb	RF-ADMIN-001 a 005 y 007: cuentas, carreras, permisos, revocación con reasignación y dashboard de alertas. RF-AUDIT-001 a 003 y RF-REVISOR-001. RF-PROC-005: exportar expedientes en ZIP. Notificaciones en campana. Configuración de producción	Panel de Admin (usuarios, carreras, permisos, alertas). Vista de auditoría con filtros para Admin y Revisor. Campana de notificaciones. Exportación de expedientes. Pruebas de punta a punta con los seis roles

Criterios de cierre del Hito 4

- [ ] Las 26 transiciones tienen test de integración y la demo lleva una solicitud de `SOL-INI` a `E3-INI`.
- [ ] Revocar un permiso corta el acceso al instante y obliga a reasignar sus solicitudes.
- [ ] El Revisor ve la auditoría completa y no puede modificar nada.
- [ ] Despliegue con variables de entorno de producción y backup de la base.

Riesgos y próximos pasos

Riesgo	Impacto	Mitigación
El contrato de la API no se acuerda en S1	El frontend trabaja contra mocks que después no coinciden	Reunión de cierre del §10.3 en la primera semana; cambios posteriores pasan por `GESTION_CAMBIOS.md`
Se aprueban los cambios CC-001 a CC-005 (permisos por facultad)	Cambian el modelo de permisos y los endpoints de Admin	Decidirlos antes de S4, cuando se implementan los permisos por carrera
Credenciales de Google OAuth y del servidor de mail de la USAL	Bloquea el login institucional y las notificaciones	Pedirlas en S1; mientras tanto, mail local de prueba y login simulado en desarrollo

Riesgo	Impacto	Mitigación
Estados posteriores a `E3-INI` sin definir	La descarga del expediente (RF-ASP-008) y la reapertura (RF-ADMIN-006) quedan fuera	Se planifican en un Hito 5 cuando la v13 de requisitos los defina
Equipo chico o fiestas	Los sprints S5 y S6 se estiran	Priorizar el camino feliz de cada hito y dejar los caminos alternativos para el sprint siguiente

Próximos pasos

- [ ] Validar este plan con el equipo y ajustar fechas según cuántas personas hay.
- [ ] Cargar las historias del Hito 1 en el tablero (GitHub Projects, Jira o Trello).
- [ ] Agendar la reunión de cierre del contrato de la API para la semana del 19 de octubre.
